Intro

Evolution de notre processus de conception
Présentation de la démarche et des principes clés

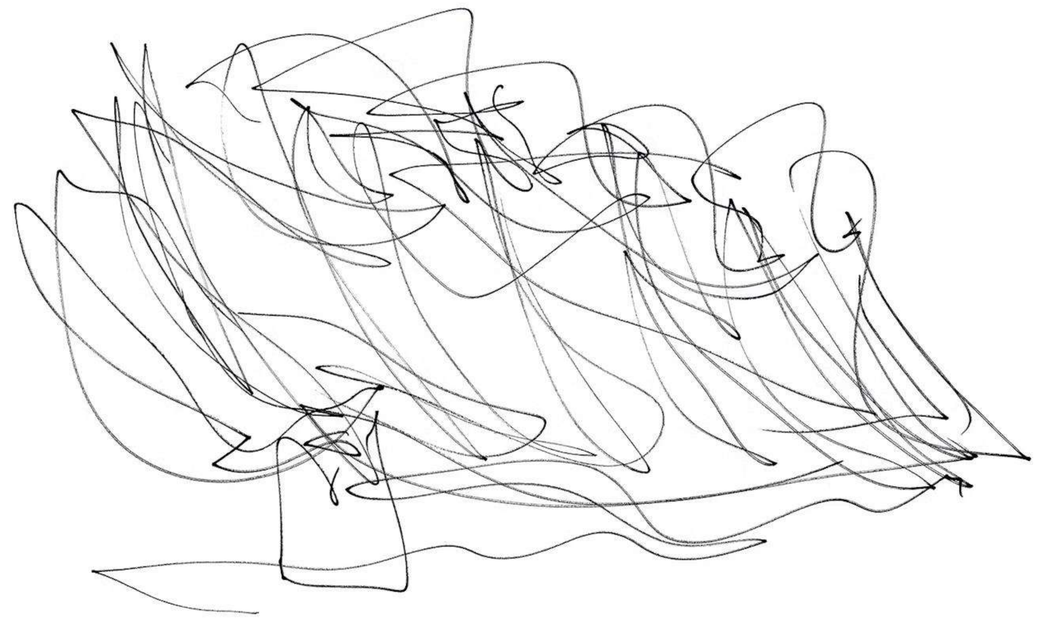

France VAE 3/02/2025

Comment on travaille ?

Aujourd'hui

Faire cohabiter les demandes de chaque pole de compétences

Demain

Etre tous contributeurs dans la construction du même service

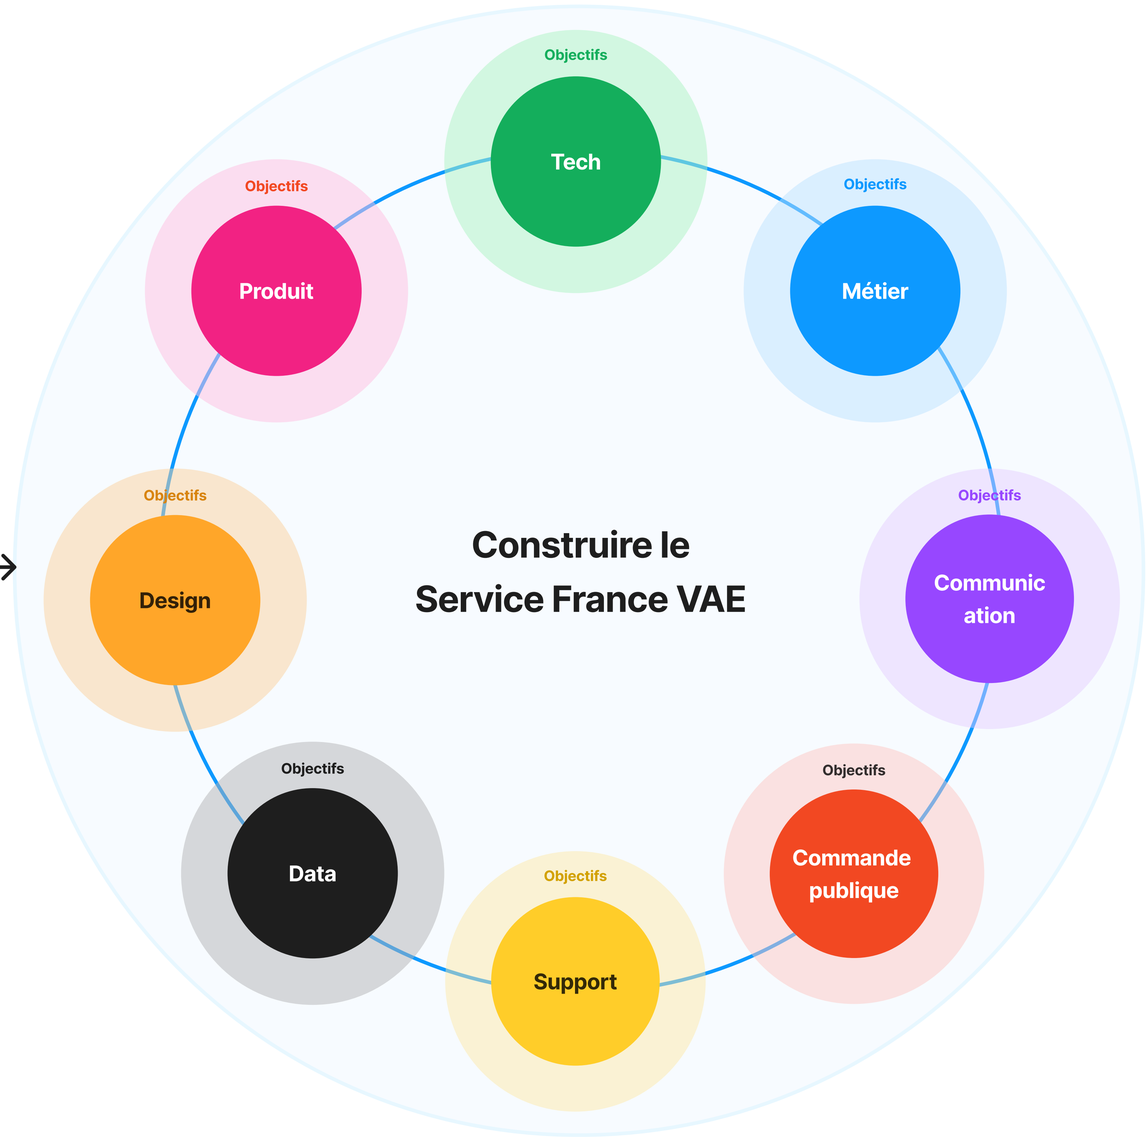

Objectif to Initiative

Prendre les objectifs,
les irritants et les entrants
de chaque pôle,

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Et les convertir en initiatives
pour répondre à l'objectif de France VAE
Construire et déployer le service public de la VAE

Initiative

\+ Initiative

\+ Initiative

\+ Initiative

\+ Initiative

\+ Initiative

\+ Initiative

Objectif, initiative, fonctionnalité

Objectif VAE

BUT

ex : 100% certifications demandées/usagers sur la plateforme

ce qu’on cherche à atteindre

Objectif, initiative, fonctionnalité

Objectif VAE

BUT

ex : 100% certifications demandées/usagers sur la plateforme

ce qu’on cherche à atteindre

Initiative Roadmap

QUOI

ex : Permettre aux certificateurs de référencer leurs diplômes sur FVAE

ce qu’on doit mettre en oeuvre pour construire notre service et contribuer à l’atteinte de l’objectif

Objectif, initiative, fonctionnalité

Objectif VAE

BUT

ex : 100% certifications demandées/usagers sur la plateforme

ce qu’on cherche à atteindre

Initiative Roadmap

QUOI

ex : Permettre aux certificateurs de référencer leurs diplômes sur FVAE

ce qu’on doit mettre en oeuvre pour construire notre service et contribuer à l’atteinte de l’objectif

Parcours, fonctionnalités

COMMENT

ex : Formulaire de demande depuis la page certificateur du site FVAE

ce qu’on développe et qu’on met en main de nos usagers

Incertain vs Précis

Objectif VAE

ex : 100% certifications demandées/usagers sur la plateforme

Incertain

Initiative Roadmap

ex : Permettre aux certificateurs de référencer leurs diplômes sur FVAE

Incertain

Parcours, fonctionnalité

ex : Formulaire de demande depuis la page certificateur du site FVAE

Précis

Contribution initiative to objectif

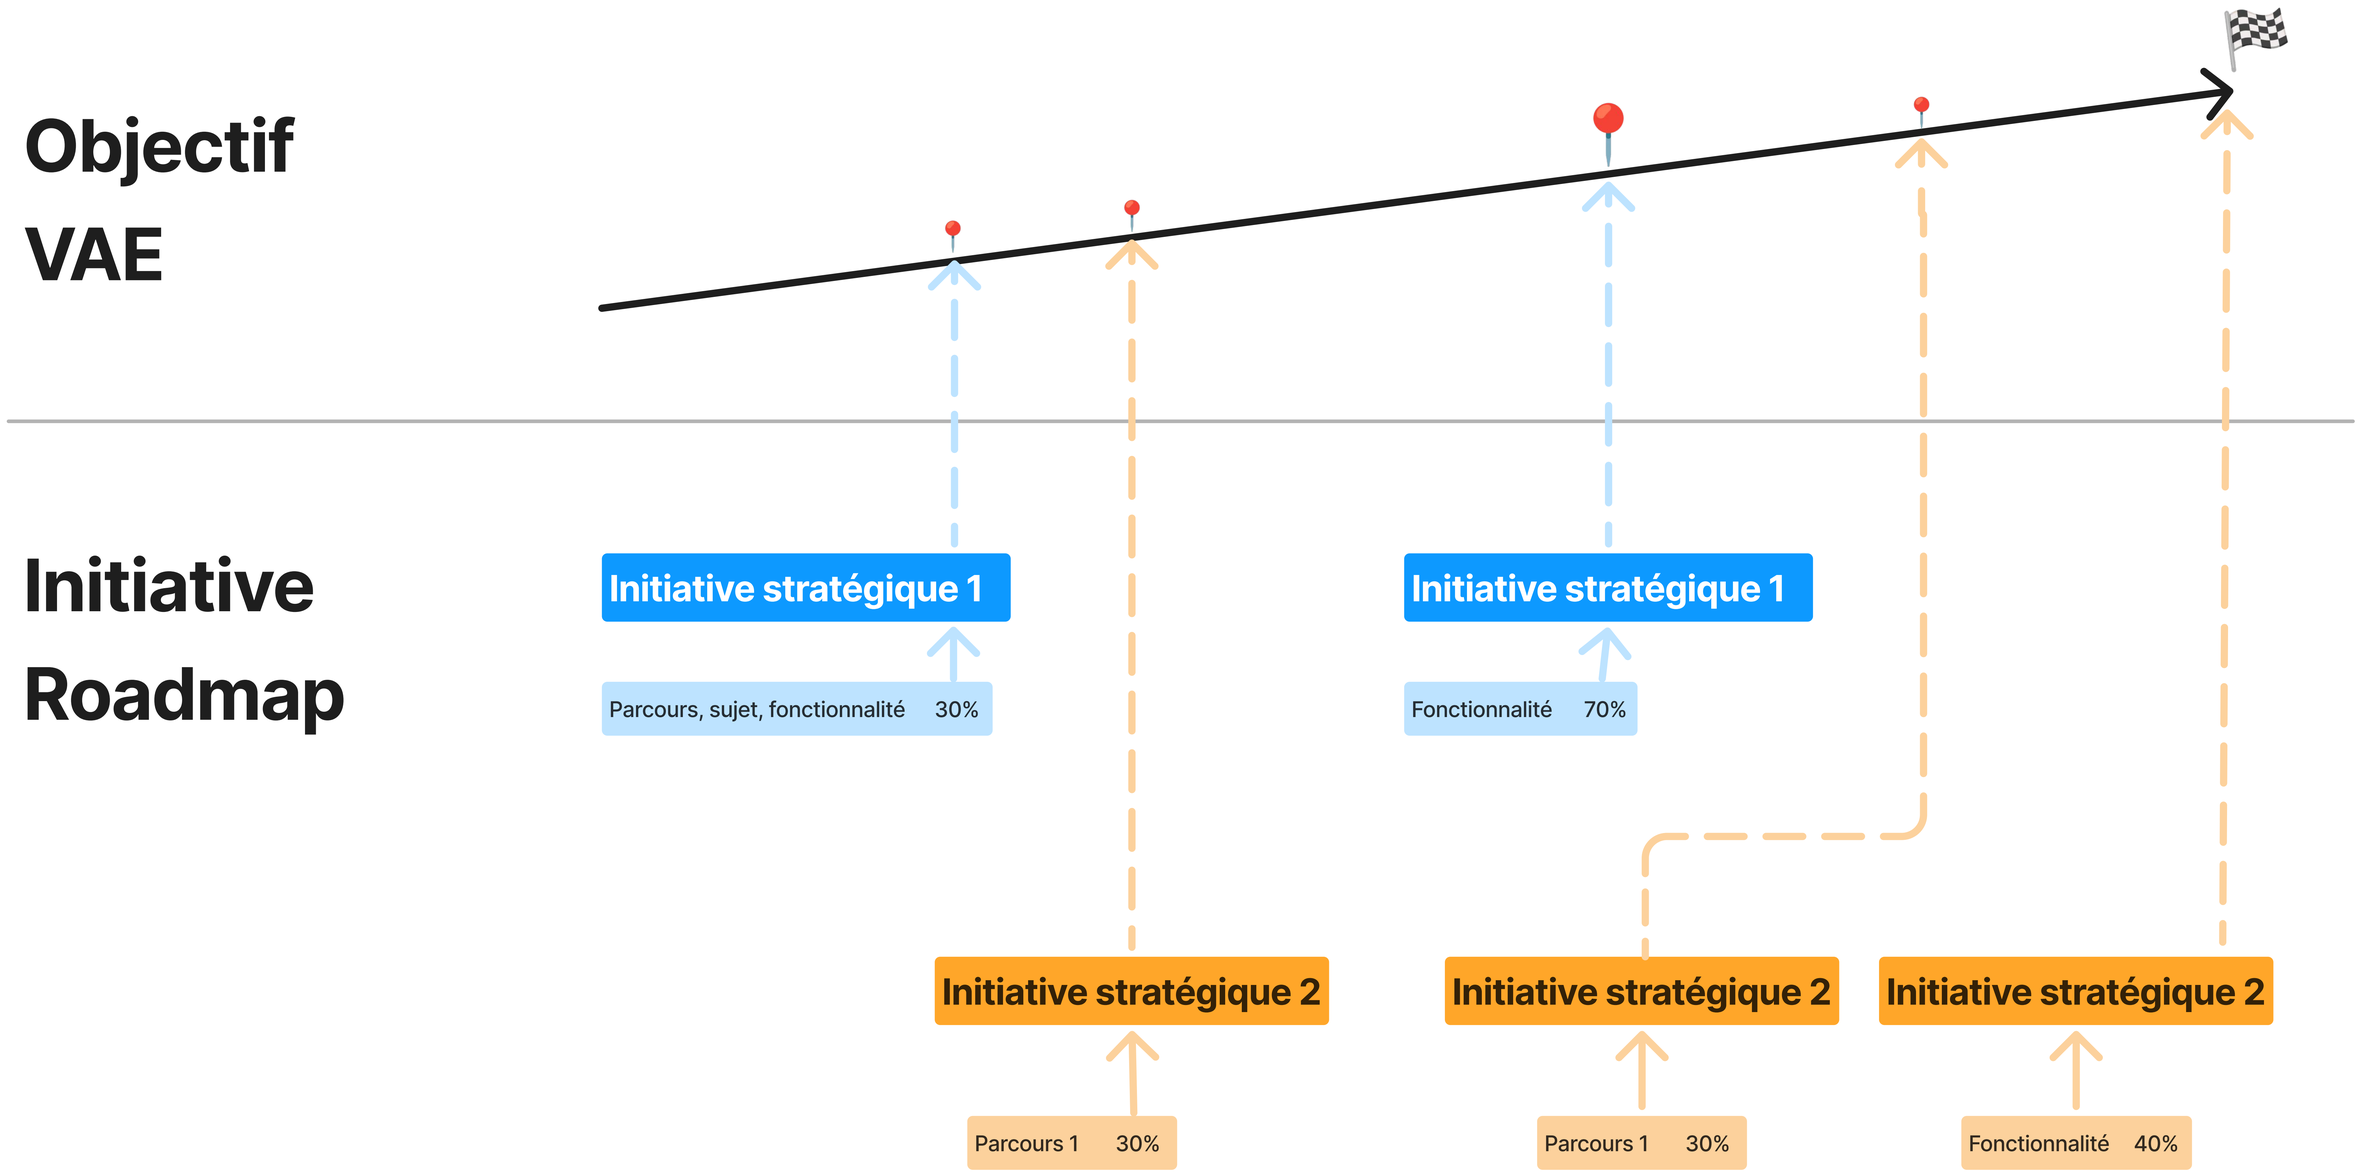

?

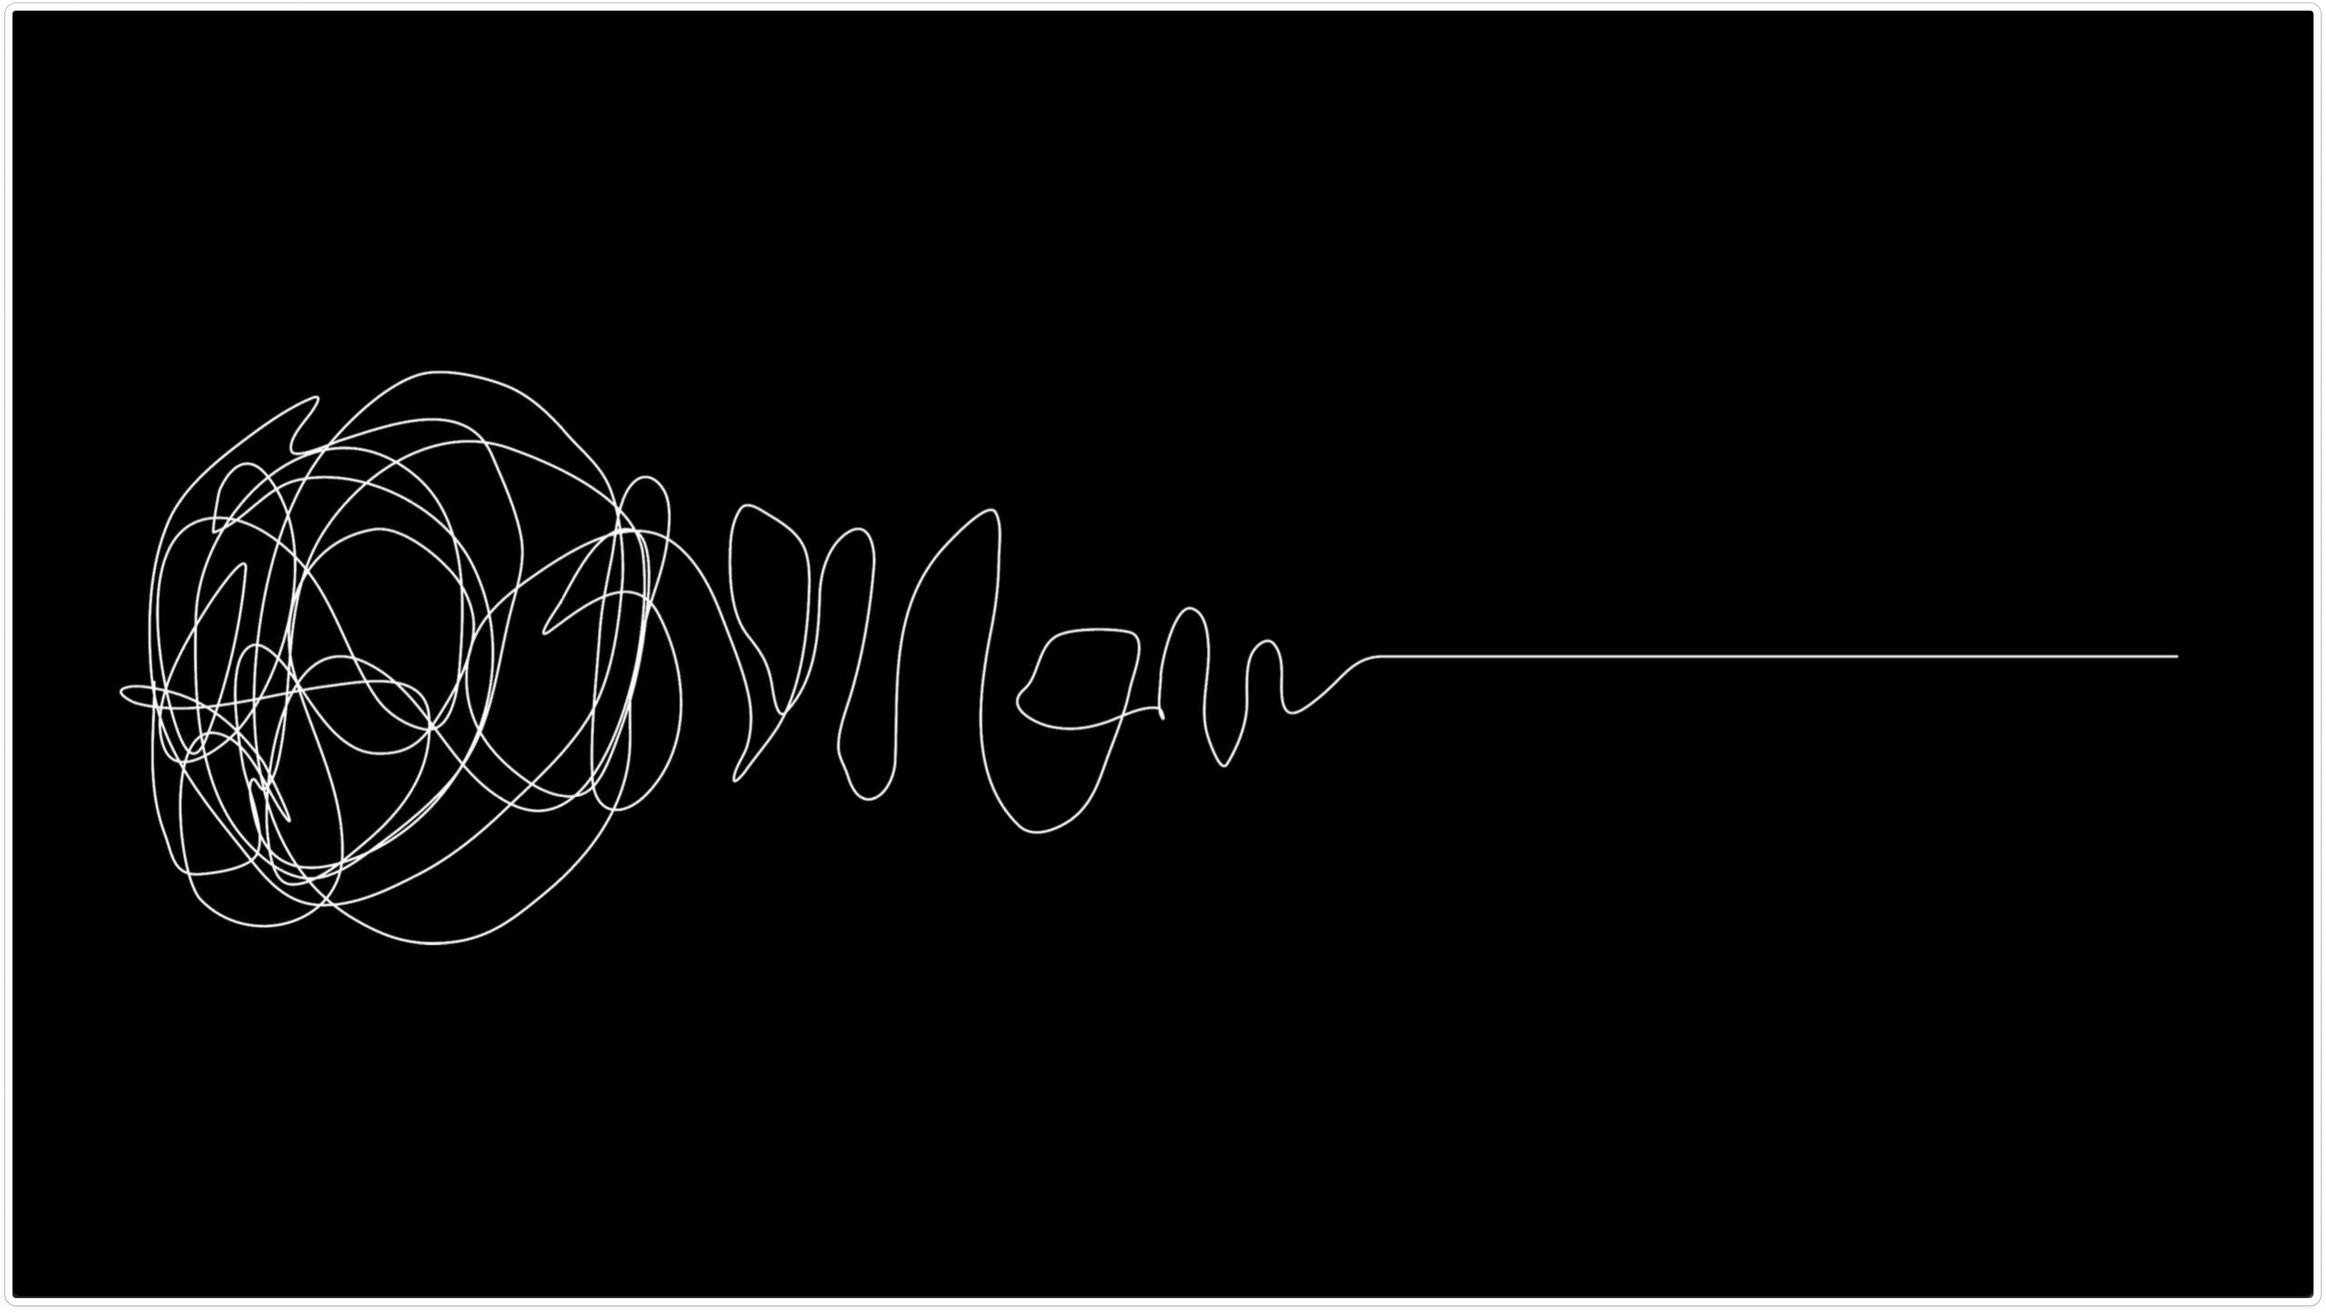

Maturité projet

Ceci est normal, c'est la nature même d'un projet.

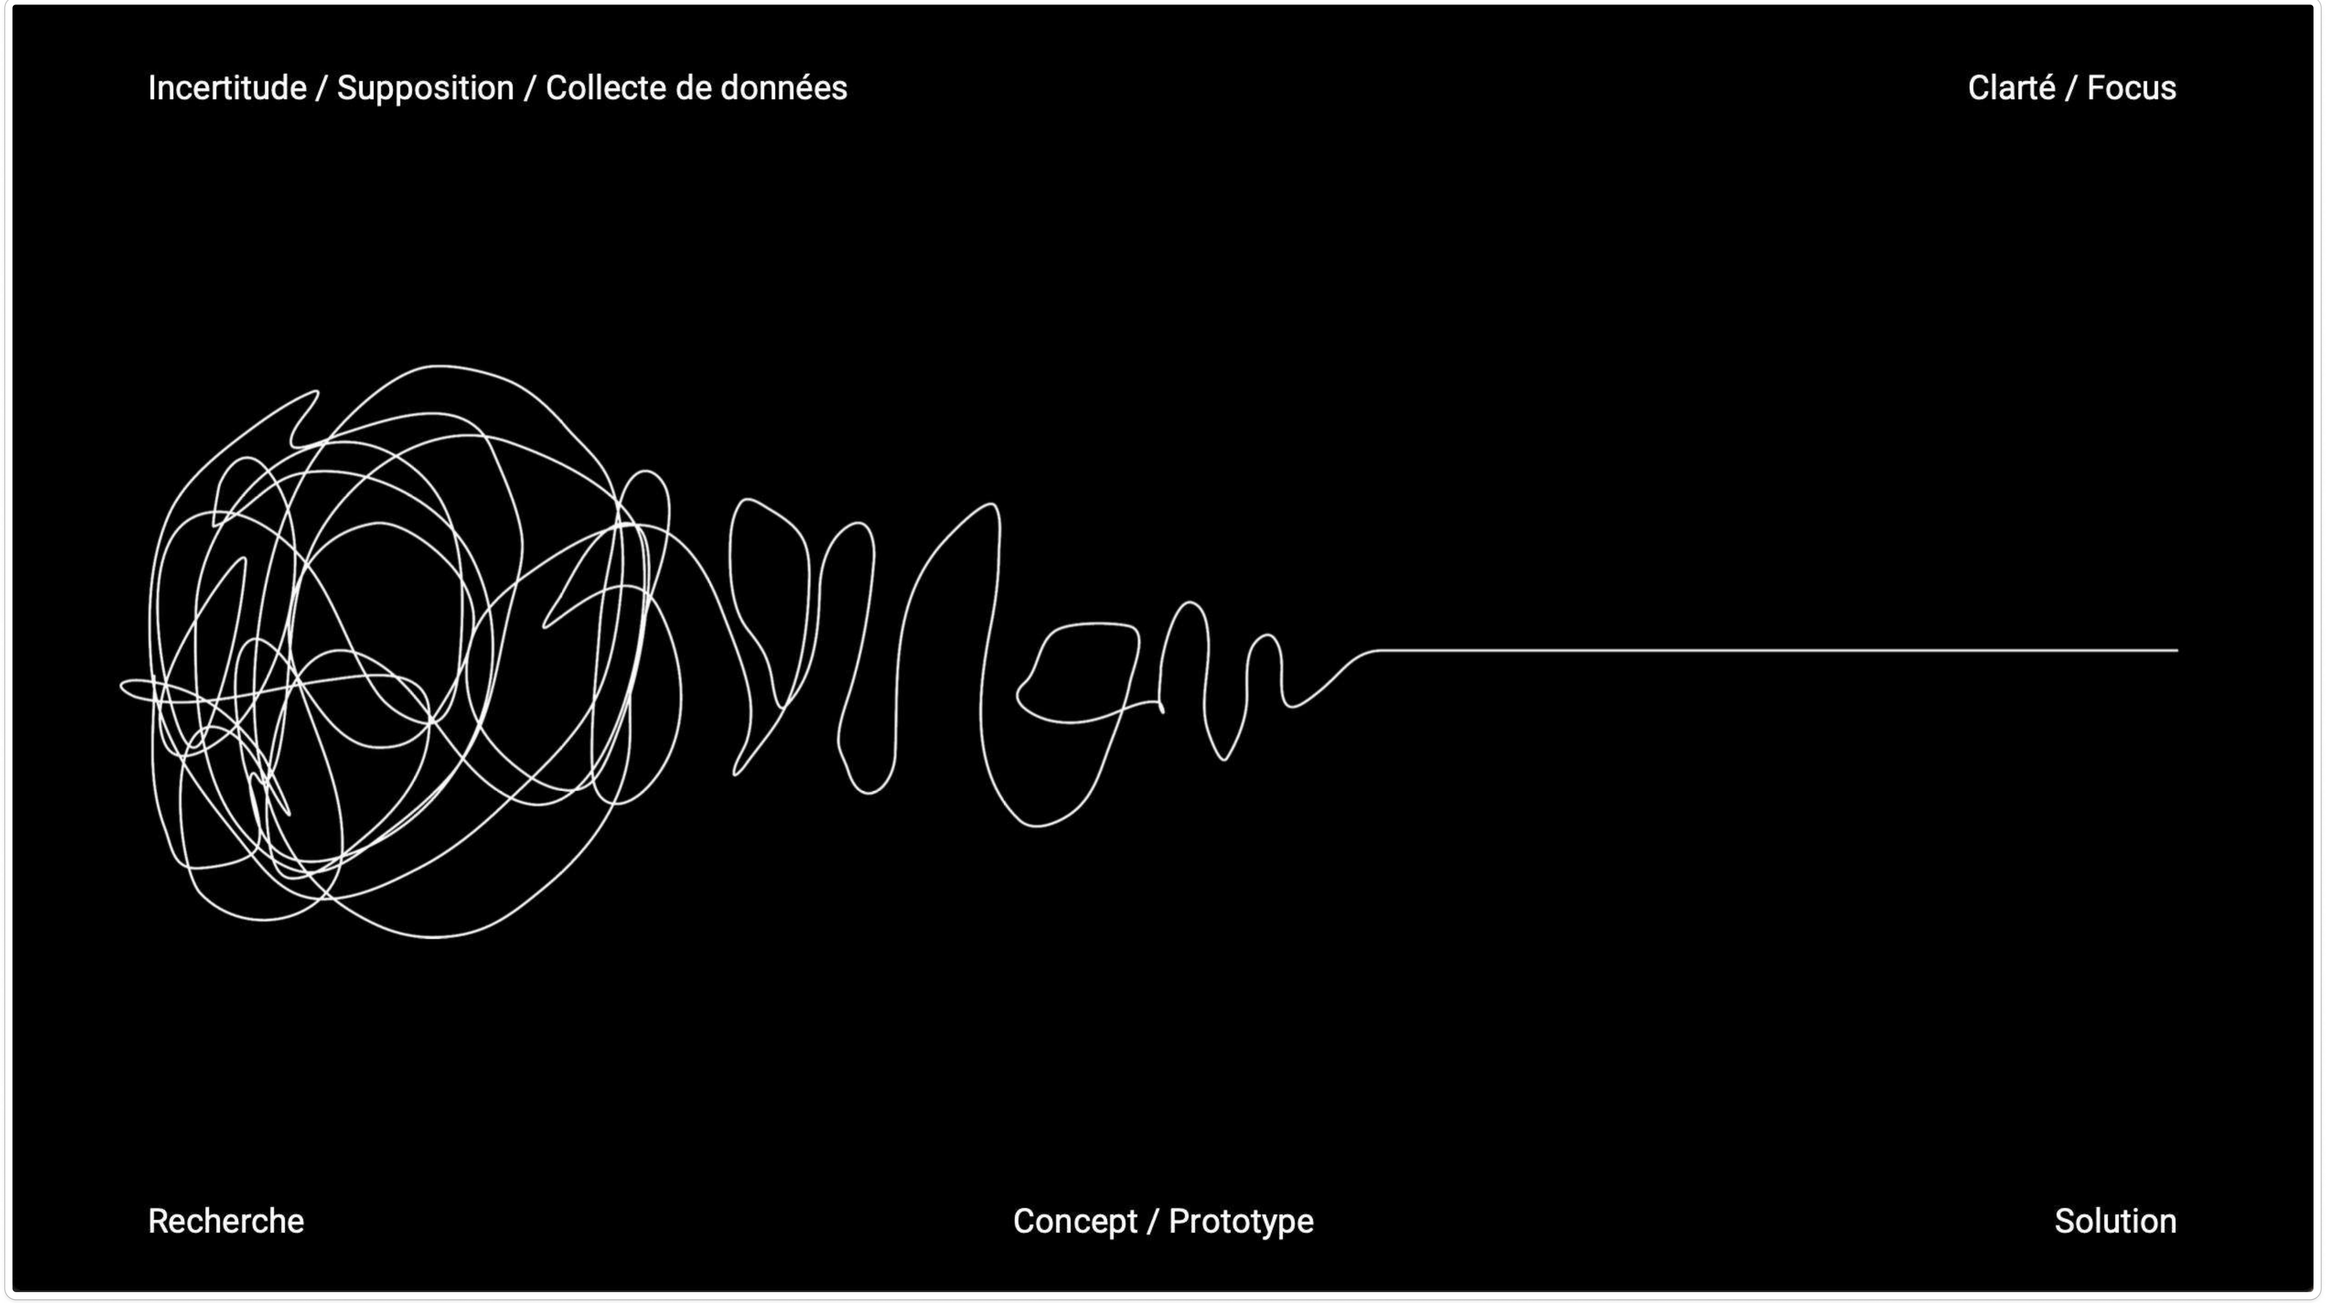

Discovery vs Delivery

Discovery

= Découvrir, Expérimenter, comprendre,

Réduire l’incertitude et s’assurer qu’on construit quelque chose qui **répond vraiment aux besoins des utilisateurs.** En gros, avant de foncer tête baissée dans la fabrication, on s’assure qu’on va dans la bonne direction.

Delivery

= Réaliser, développer, mettre en production

Réaliser les fonctionnalités qui contribuent à une initiative de la roadmap.

Mettre en production le plus vite possible une solution qui contient les bonnes specs.

Focus Discovery

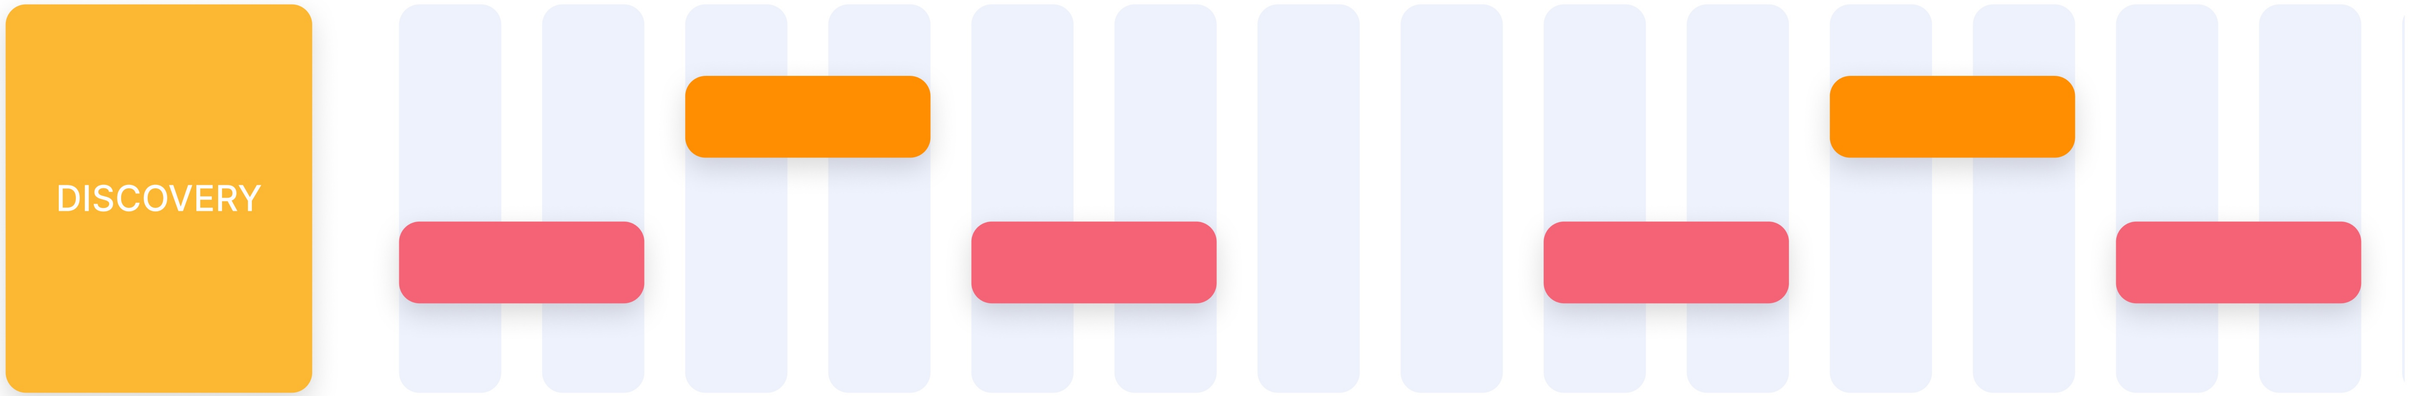

Sert à mettre au clair :

- Quel est notre réelle connaissance du sujet VS notre désir de sortir vite ?
- Combien de phases de découverte sont nécessaires pour arriver au bon niveau de maturité ?
- Est-ce que la demande qu’on me formule est claire ? Quelle est la cause du problème qu’on remonte ?
- Si on gratte derrière le besoin remonté, est-ce qu’on va découvrir 5 autres problèmes à traiter ?
- Comment estimer correctement le périmètre ?
- Le scope est-il adapté à la taille de l'équipe ?
- Le scope est-il adapté au temps dont on dispose ?

Discovery missions

DISCOVERY

2 TYPES DE MISSIONS À RÉALISER DURANT LE CADRAGE DU PROJET

I Investigation

OBJECTIF

Comprendre l’utilisateur et son contexte
Comprendre le contexte de l’écosystème
Définir le problème

POUR

Clarifier le scope
Définir les impacts
Bien définir les attentes des utilisateurs

COMMENT

Collecte d’information
Analyses de datas
Définition de la cause du pb
Détection des opportunités

E Expérimentation

OBJECTIF

Créer de la valeur
Exprimer la vision
Rendre tangible un concept

POUR

Définir les contours de l’expérience
Définir les principes d’intéraction
Produire une UX à 80%
Définir une nouvelle archi technique

COMMENT

Concepts fonctionnels
Prototypes wireframes
Prototypes UI
POC technique, POC fonctionnel

Phases Discovery & Delivery

Légende

- **Discovery** : Atteindre le bon niveau de maturité sur la définition d'une solution qui réponde à une pb utilisateur
- **Delivery** : Réalisation des parcours et fonctionnalités de la roadmap

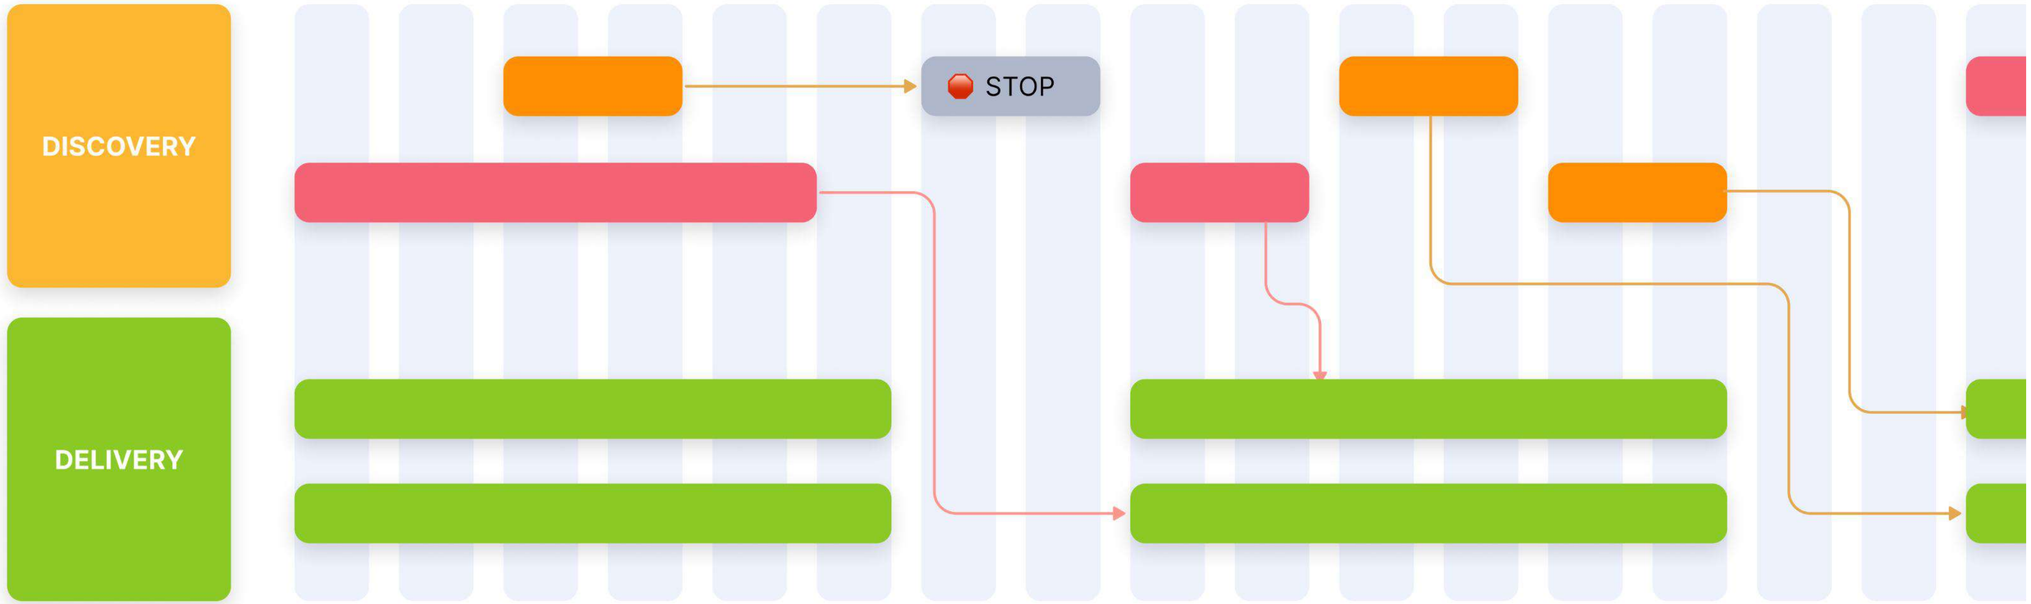

2 lignes en parallèle

Discovery nourrit Delivery

Roadmap - Focus 1 saison

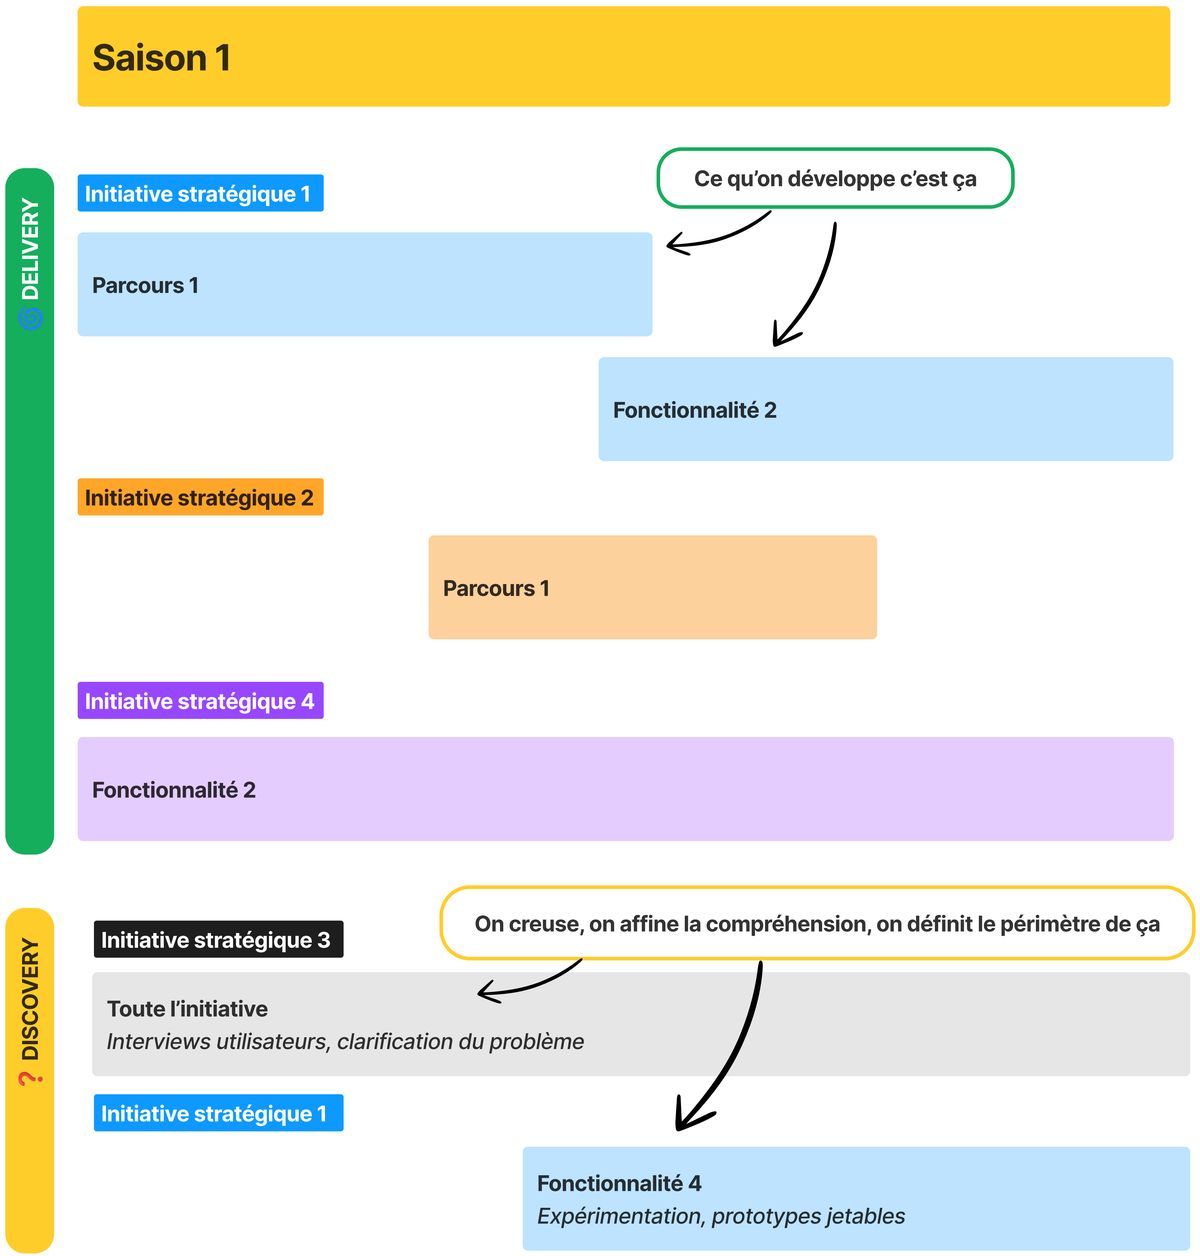

En Delivery, c'est sec, on a les maquettes, on a les specs précises, c'est prêt à être codé et MEP.
En Discovery, c'est pas mature, on comprend pas encore ce qu'on doit faire et pourquoi on le fait et si c'est vraiment important

Roadmap - Focus 2 saisons

Pas de cycle en V, initiatives repriorisées

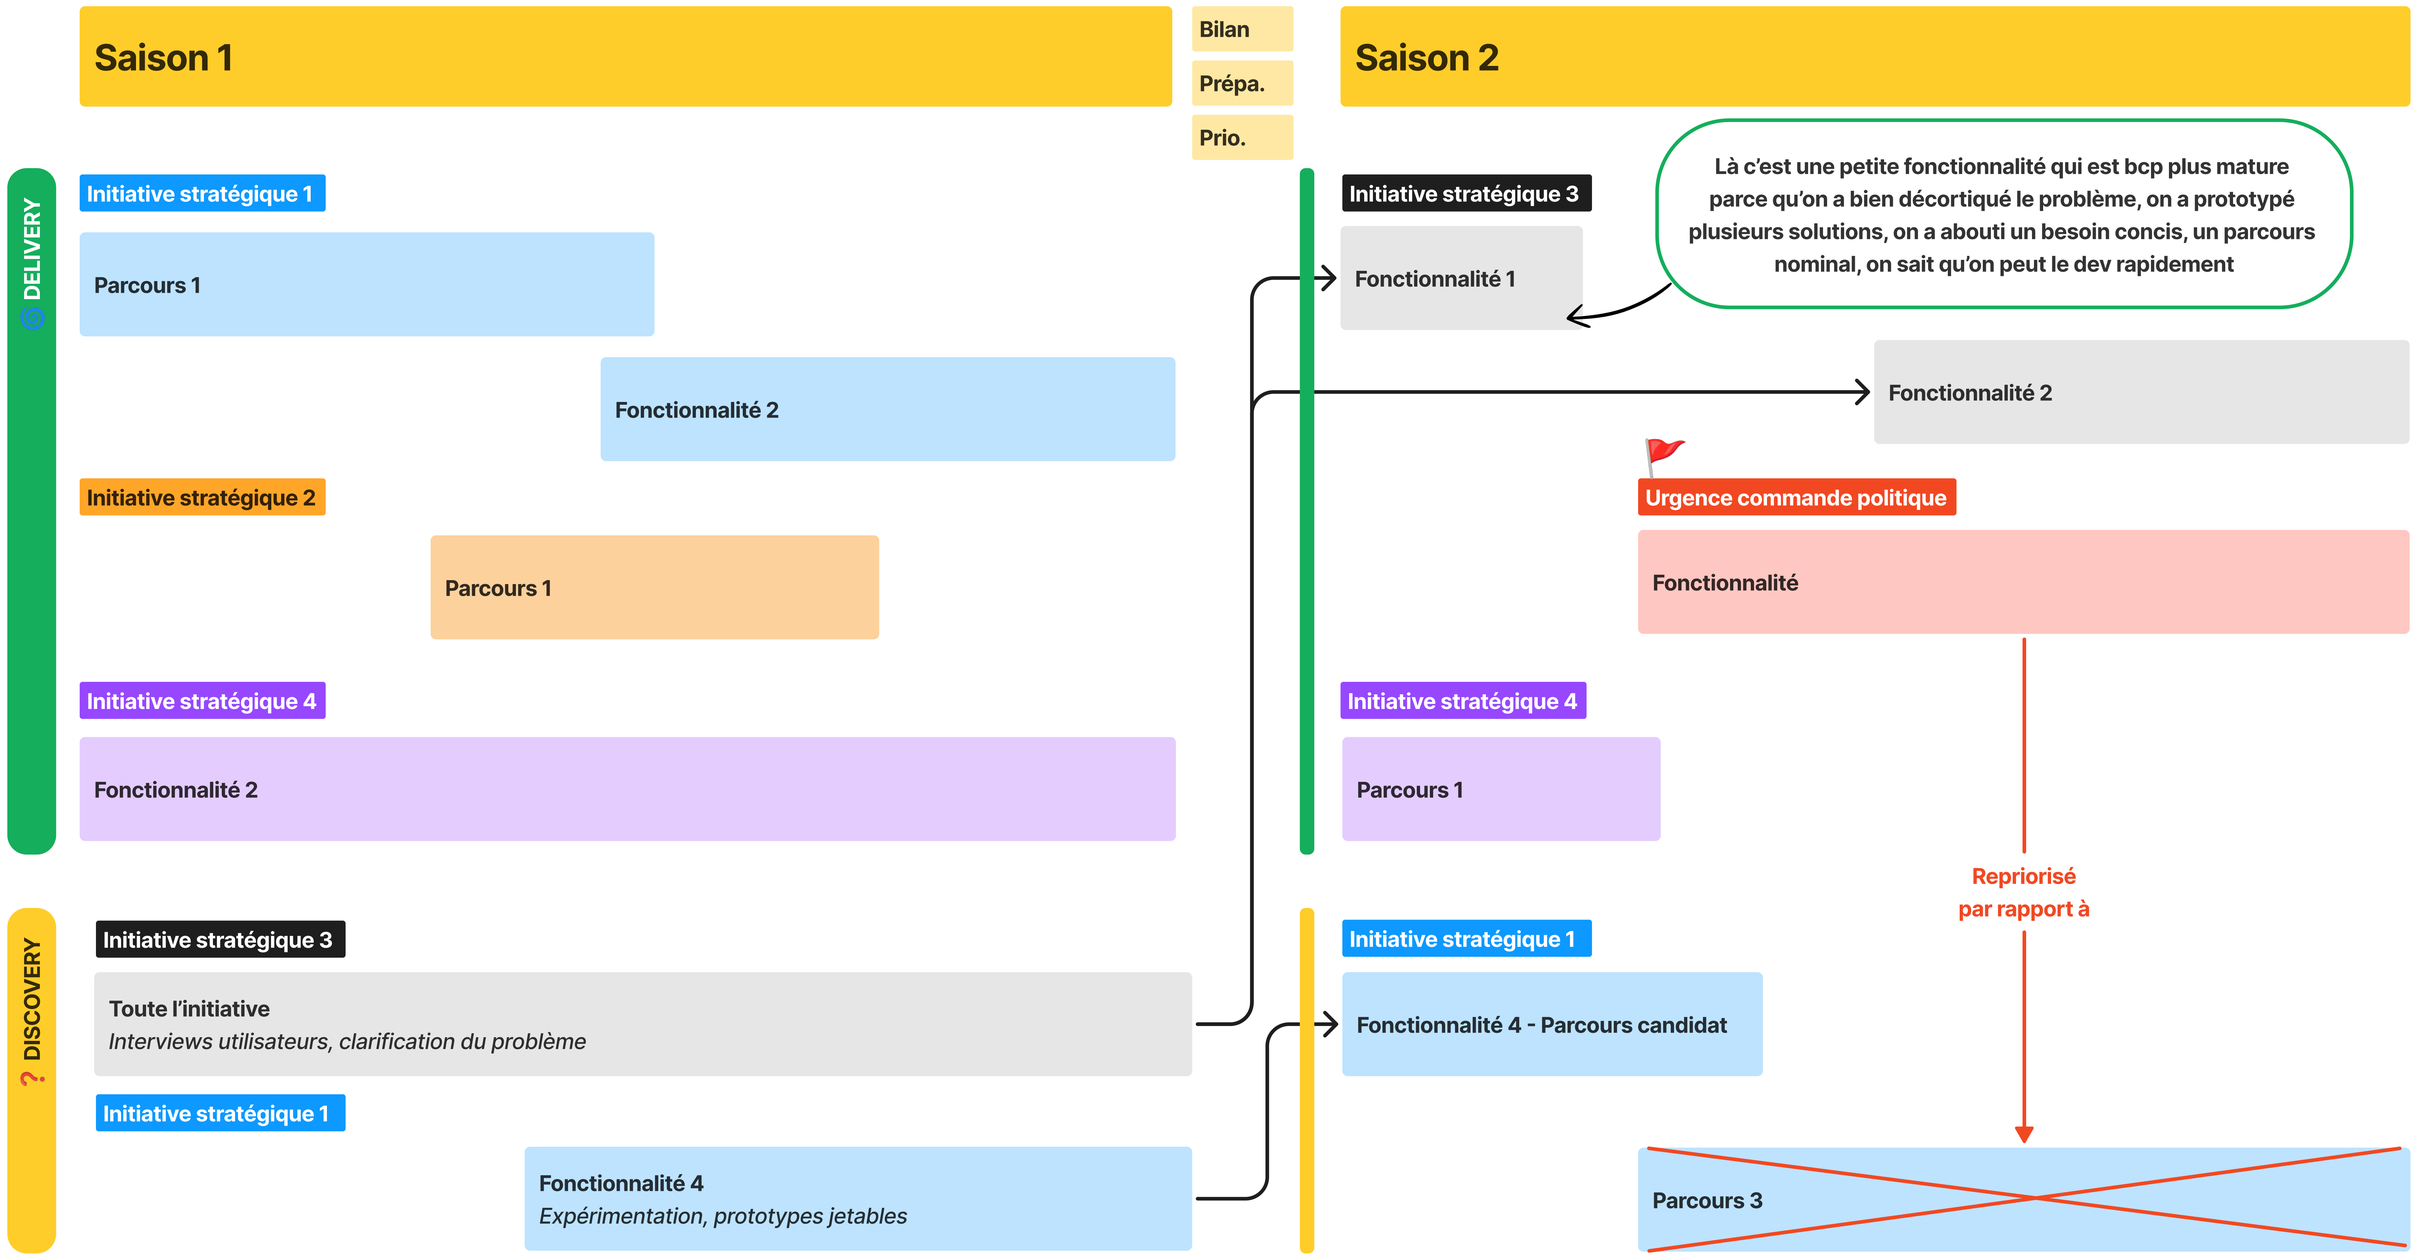

Entre les saisons, on repriorise les sujets. Donc on peut changer l'ordre des sujets qu'on va traiter.
On contribue à une initiative plusieurs fois dans le temps, sans que ce soit forcément linéaire.

Conception d'une initiative de roadmap

AUJOURD'HUI

Incertitude / Supposition / Peu de maturité

Clarté / Focus

NOUVELLES DEMANDES | DÉFINIR POURQUOI ON LE FAIT | LE FAIRE BIEN

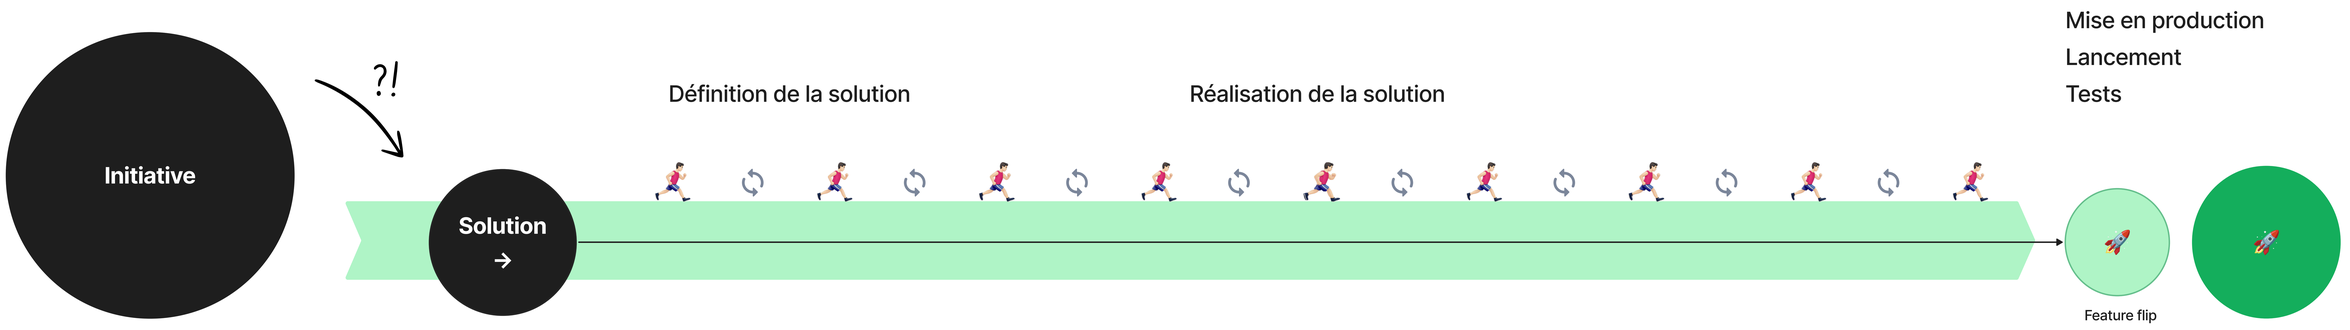

Quand	En continu			
Phase	**Alimentation** Alimentation de la roadmap	**Organisation des équipes** Création des cores team pour chaque parcours priorisé	**Conception** Solution designée, spécifications fonctionnelles et techniques prêtes	**Développement et MEP** Chaque parcours est dév, recetté et MEP
Qui	**Sources** OG, DGEFP, Support, Ecosystème, Tests....	**1 pilote** 1 PO / 1 UX / 1 métier / 1 tech	**Tous** 1 PO / 1 UX / 1 métier / 1 tech	**Tech** PO /UX / métier

Conception d'une initiative de roadmap

DEMAIN

Incertitude / Supposition / Peu de maturité

Clarté / Focus

NOUVELLES DEMANDES

DÉFINIR POURQUOI ON LE FAIT

QU'EST CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT POUR LA PÉRIODE À VENIR ?

EST-CE QU'ON EST SUFFISAMMENT MATURE ?

EST-CE QU'ON EST CONFIANT POUR DEV ?

TOUT PRÉPARER

LE FAIRE BIEN

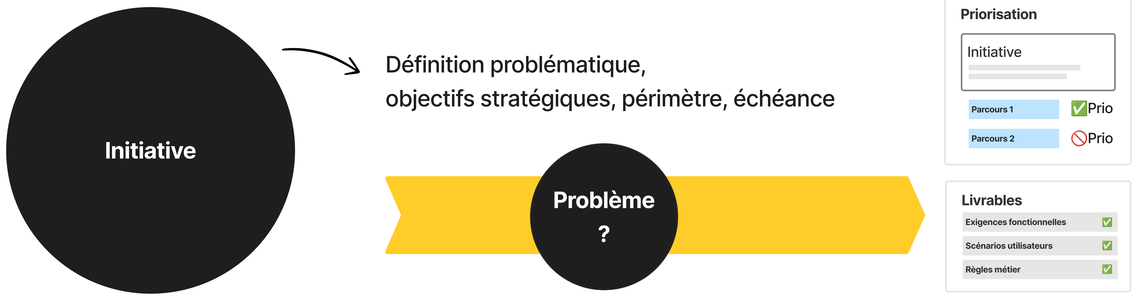

Revue Kick off saison

Quand	Tout le temps	En cours de saison / En parallèle du delivery	Durant comité de pilotage	Kick off saison	Saison	Saison
Phase	**Alimentation** Alimentation de la roadmap	NEW **Définir le problème** Initiatives Pré-cadrées, problème/ opportunité identifiée, précisée et découpées en parcours	NEW **Priorisation** Parcours et fonctionnalités priorisés avec tous les pôles de compétences	**Organisation des équipes** Création des cores team pour chaque parcours priorisé	**Conception** Solution designée, spécifications fonctionnelles et techniques prêtes	**Développement et MEP** Chaque parcours est dév, recetté et MEP
Qui	**Sources** OG, DGEFP, Support, Ecosystème, Tests....	**Pilotes Aurélie, Victor** + Experts contributeurs (support, métier...)	**Comité de coordination** Revu par les équipes au lancement saison	**1 pilote** 1 PO / 1 UX / 1 métier / 1 tech	**Tous** 1 PO / 1 UX / 1 métier / 1 tech	**Tech** PO /UX / métier

Phases Discovery, Delivery, Run

Légende

- **Discovery** : Atteindre le bon niveau de maturité sur la définition d'une solution qui réponde à une pb utilisateur
- **Delivery** : Réalisation des parcours et fonctionnalités de la roadmap
- **Run** : Développements qui débloquent des situations critiques

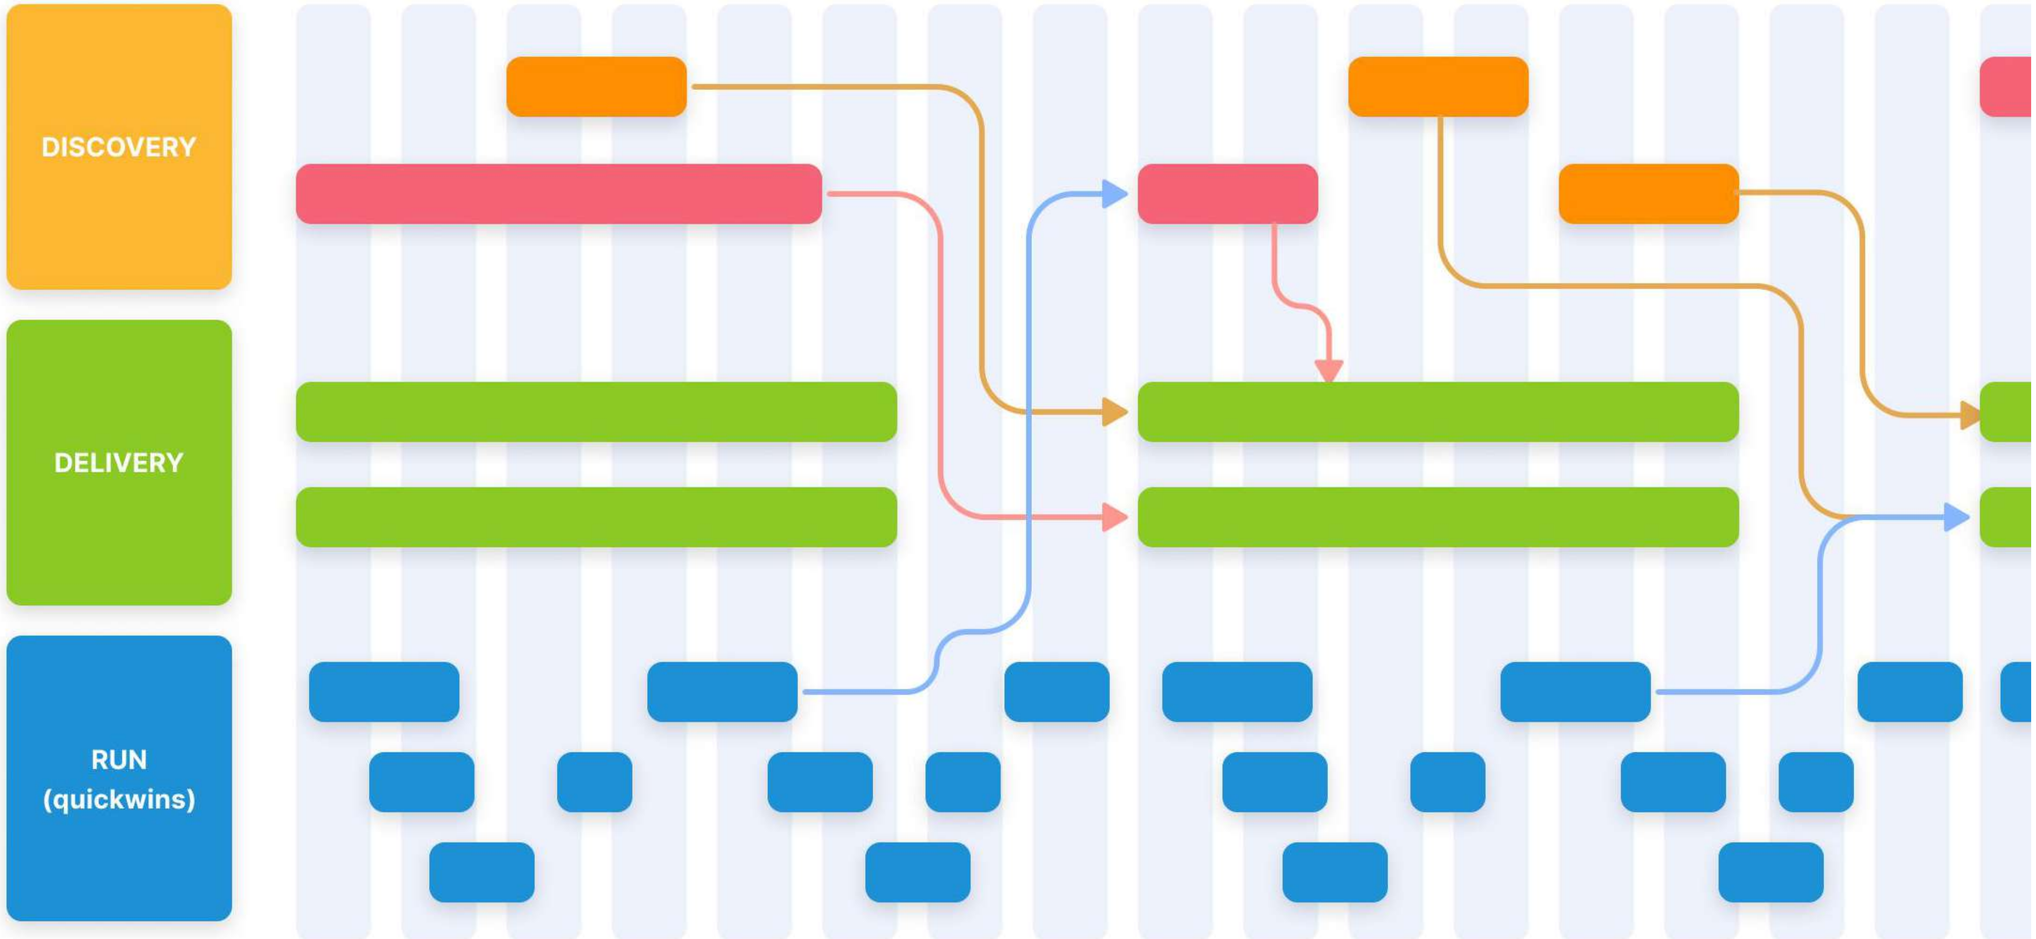

3 lignes en parallèle

Discovery nourrit Delivery

Run est en autonomie. Sujet de run peut repartir en discovery si sujet trop complexe ou scope trop large
